

# 北一女中光復樓古蹟 修復及再利用工程現況

1. 目前要徑項目為結構修補工程，截止至10月15日實際出工數1552人。
2. 預計110年10月15日完成2.36%，實際進度達3.78%，進度超前+1.42%。

110年10月15日總務處

# 第一期工區建物外觀現況



# 第一期工區建物外觀現況



# 光復樓1樓拱門內穿堂



# 光復樓1樓會議室及西側3樓長廊



# 110年10月工程進度

- 1.外牆小雨庇及女兒牆空縫結構打除施工作業。
- 2.結構補強工程施作。
- 3.施工物料整備及各工項採購作業。

# 已完成的工項


- 1.外牆磁磚打除。
- 2.管道間開口打除。
- 3.台度磁磚打除。
- 4.室內地坪打除。
- 5.隔間拆除。

# 外牆磁磚打除



外牆全數舊有磁磚剷除，後續外觀立面面磚全面舊制新作。

# 管道間開口打除



管道間開口位置打除，為新配的水電管線通道。

# 台度磁磚打除




舊有的檯度全數剝除，  
後續將進行檯度修復。

# 室內地坪打除



舊有的室內地磚打除，  
後續將新建地坪新作。

# 隔間拆除

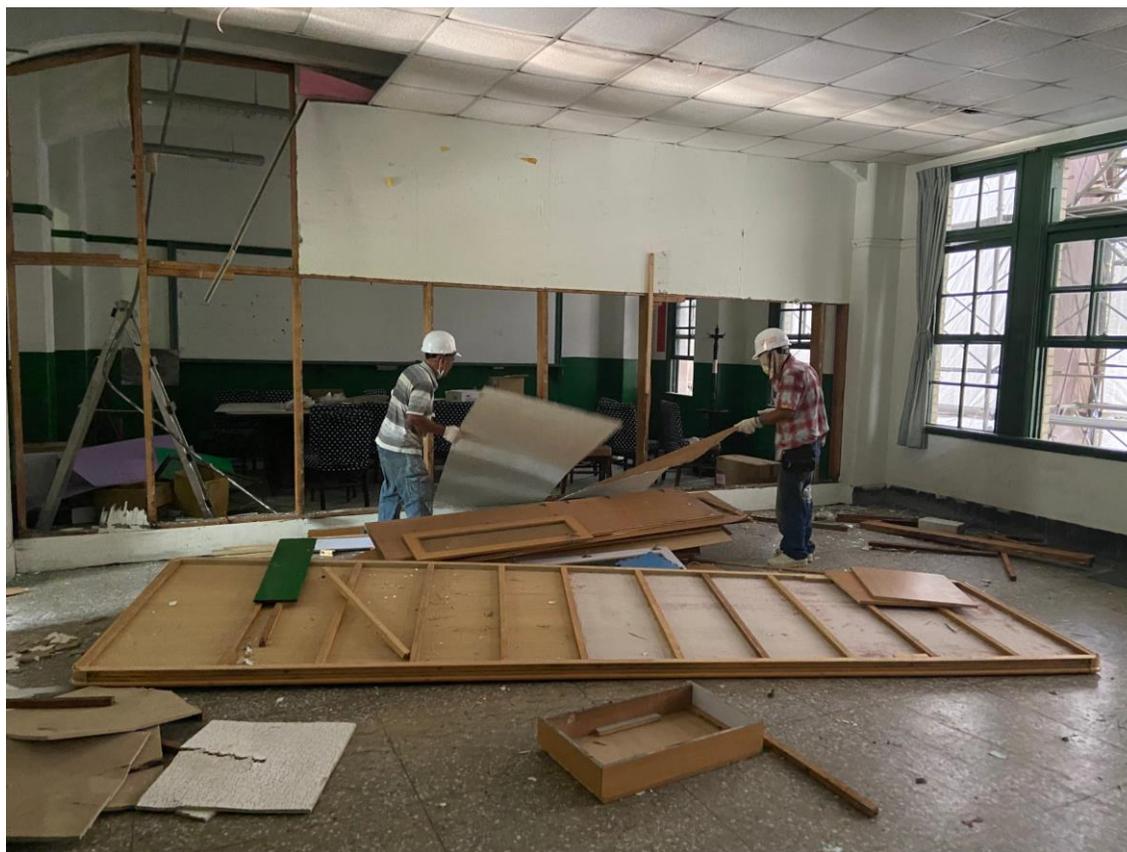

舊有的室內隔間拆除，後續將新建輕隔間牆面。

# 目前正在施作中的工項

1. 女兒牆空縫打除。
2. 管道間補強工程。
3. 結構體補強工程。
4. 機電放樣。

# 女兒牆空縫打除



舊有女兒牆打除，  
後續將新建女兒牆  
局部開口。

# 管道間補強



管道間開口打除後，後續將使用鋼板補強。

# 結構體補強



將舊有結構受損剝落之處，其脆弱部位打除。

# 結構體補強



補強方法為塗佈新舊混凝土接著劑，再使用環氧樹脂砂漿修補。

# 機電放樣



後續工程機電管線坐落位置，需放樣出位置及大小。

# 關於本案工程公共藝術設置進度

- 110年10月13日召開公共藝術執行小組第一次會議，經委員討論決議採「委託創作」徵選方式。

